


Réaménagement de la voirie et de
l'égouttage des rues du Pont Bleu, Georges
Desmet, Trieu et de la Place Valère
Grimonpont à Dottignies

Réunion d'information des riverains





13-03-2025



Un chantier : pour faire quoi ?

➔ EGOUTTAGE

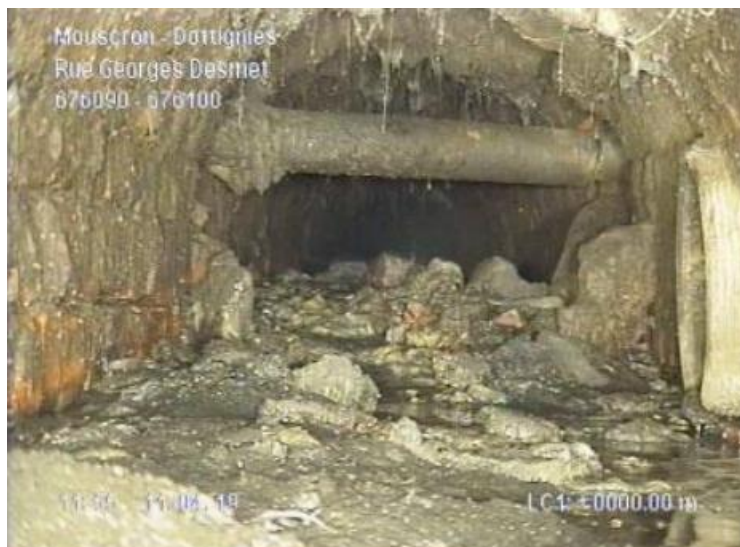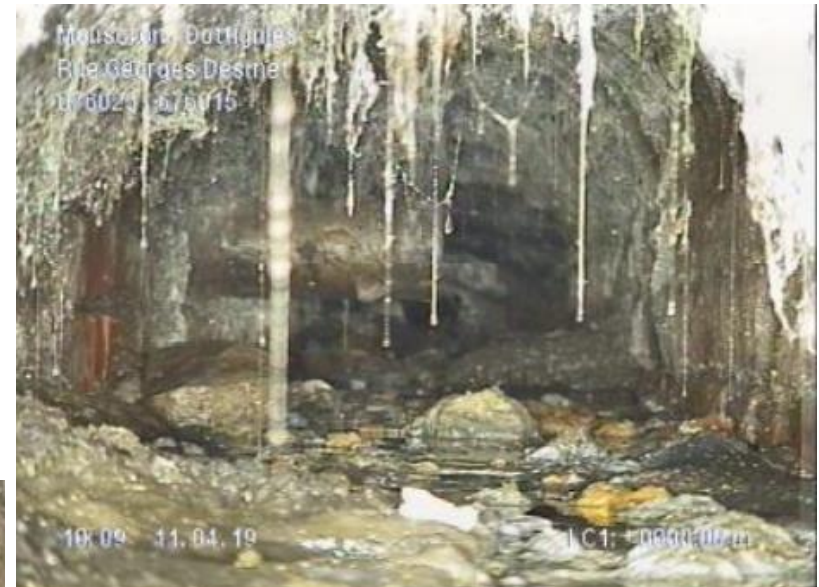

Rétroactes

22 septembre 2021 : réunion riverains – présentation du projet

2 juin 2022 : désignation des adjudicataires par le Conseil
d'Administration d'IPALLE au montant total de 5.889.960,10 € HTVA

LOT	RUE	Adjudicataire	Montant € HTVA
1	Pont Bleu (en cours)	SM Sodraep Eurovia	1.781.227,74
2	Georges Desmet et Trieu (en cours)	Eurovia sa	2.787.994,00
3	SP du Pont Bleu (en service)	TRBA sa	267.947,56
4	Bois Jacquet (réalisé)	TRBA sa	523.132,67
5	Canalisations d'eau SWDE (en cours)	Pierre Petit sprl	529.658,13

Délais prévus dans le marché (hors intempéries et travaux d'impétrants)

Rues	Délai
Egouttage de l'avenue du Bois Jacquet	70 JO
Pose de la station de pompage de la rue du Pont Bleu	35 JO
Rue du Pont Bleu et Place Valère Grimonpont (+SP)	270 JO
Rue du Trieu	260 JO
Rue Georges Desmet	185 JO


JO : Jours ouvrables

Localisation des travaux – phase 1 Pose de l'égouttage dans l'avenue du Bois Jacquet



Localisation des travaux – phase 1

Construction de la station de pompage rue du Pont Bleu (Saint-Léger)

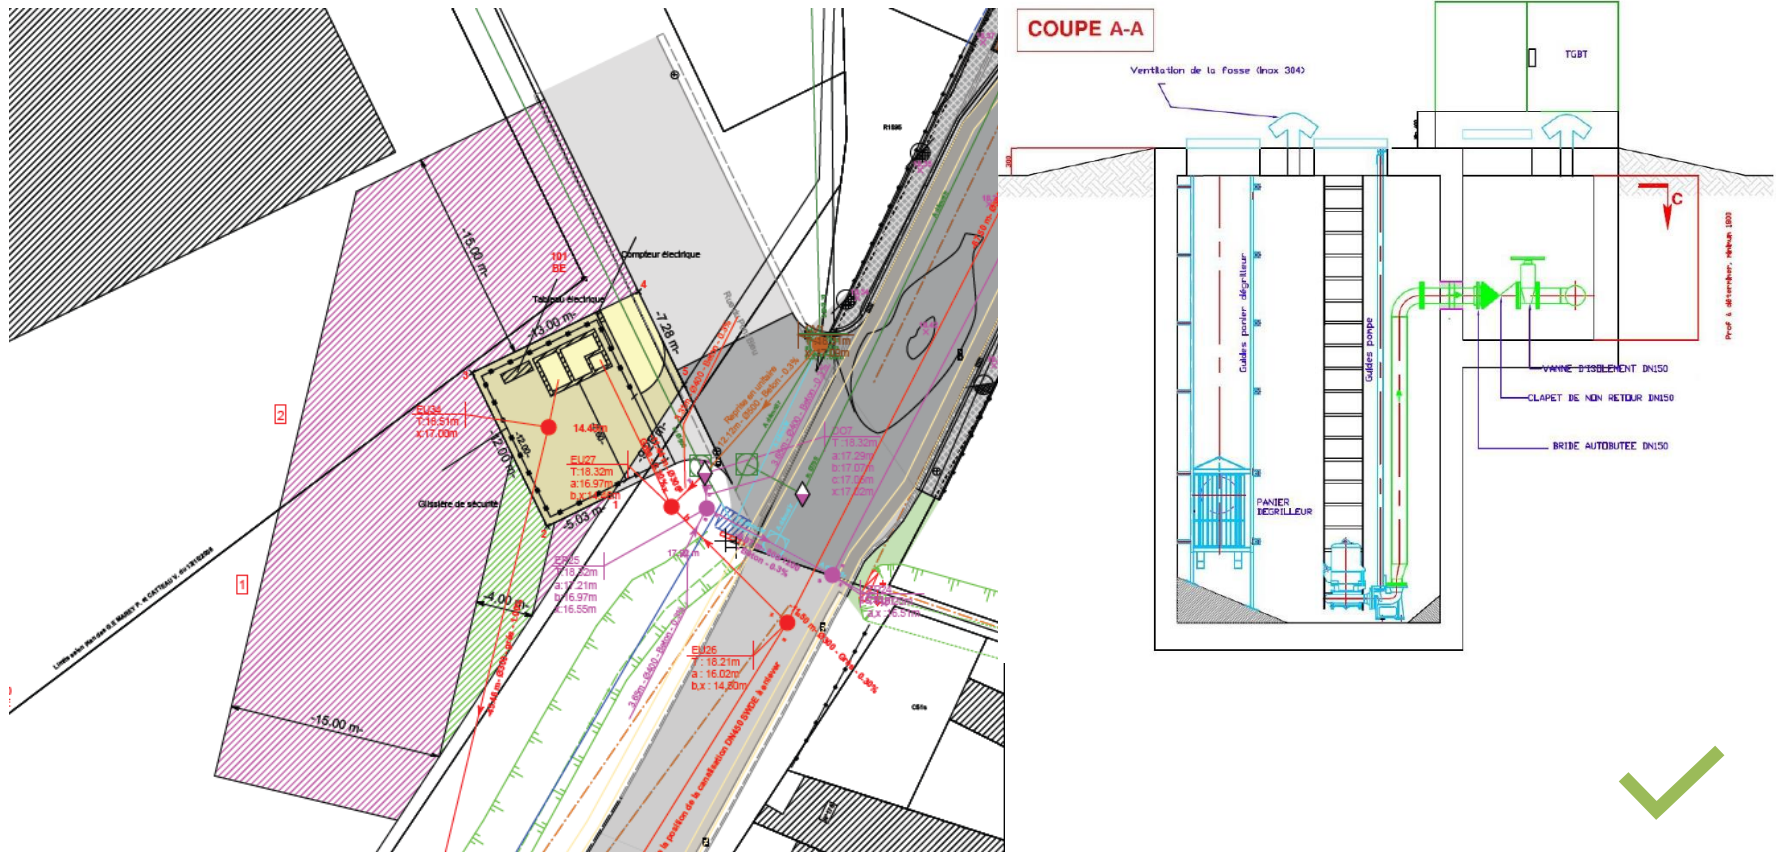

Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Phase 2a


En cours



Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Phase 2b

Ouvert à la circulation

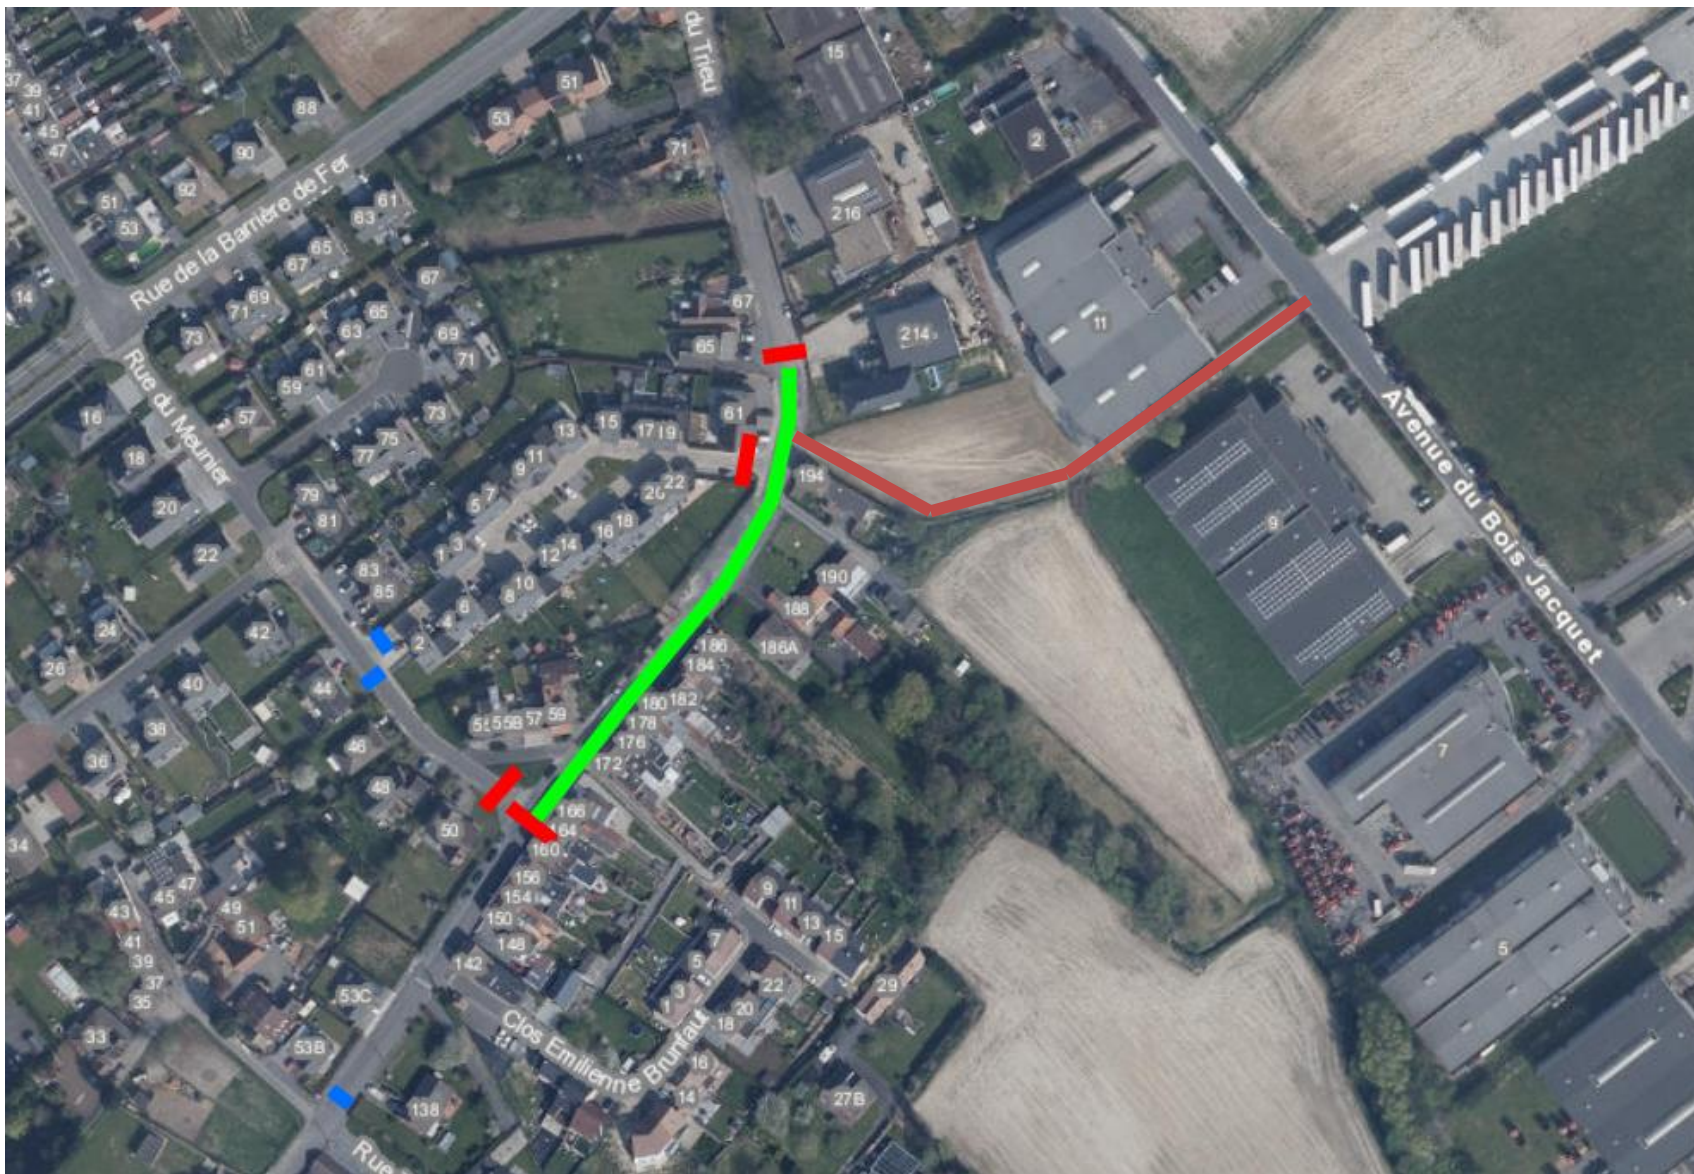

Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Phase 3 :



Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »


Phase 4 :

En cours




Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Phase 5 :

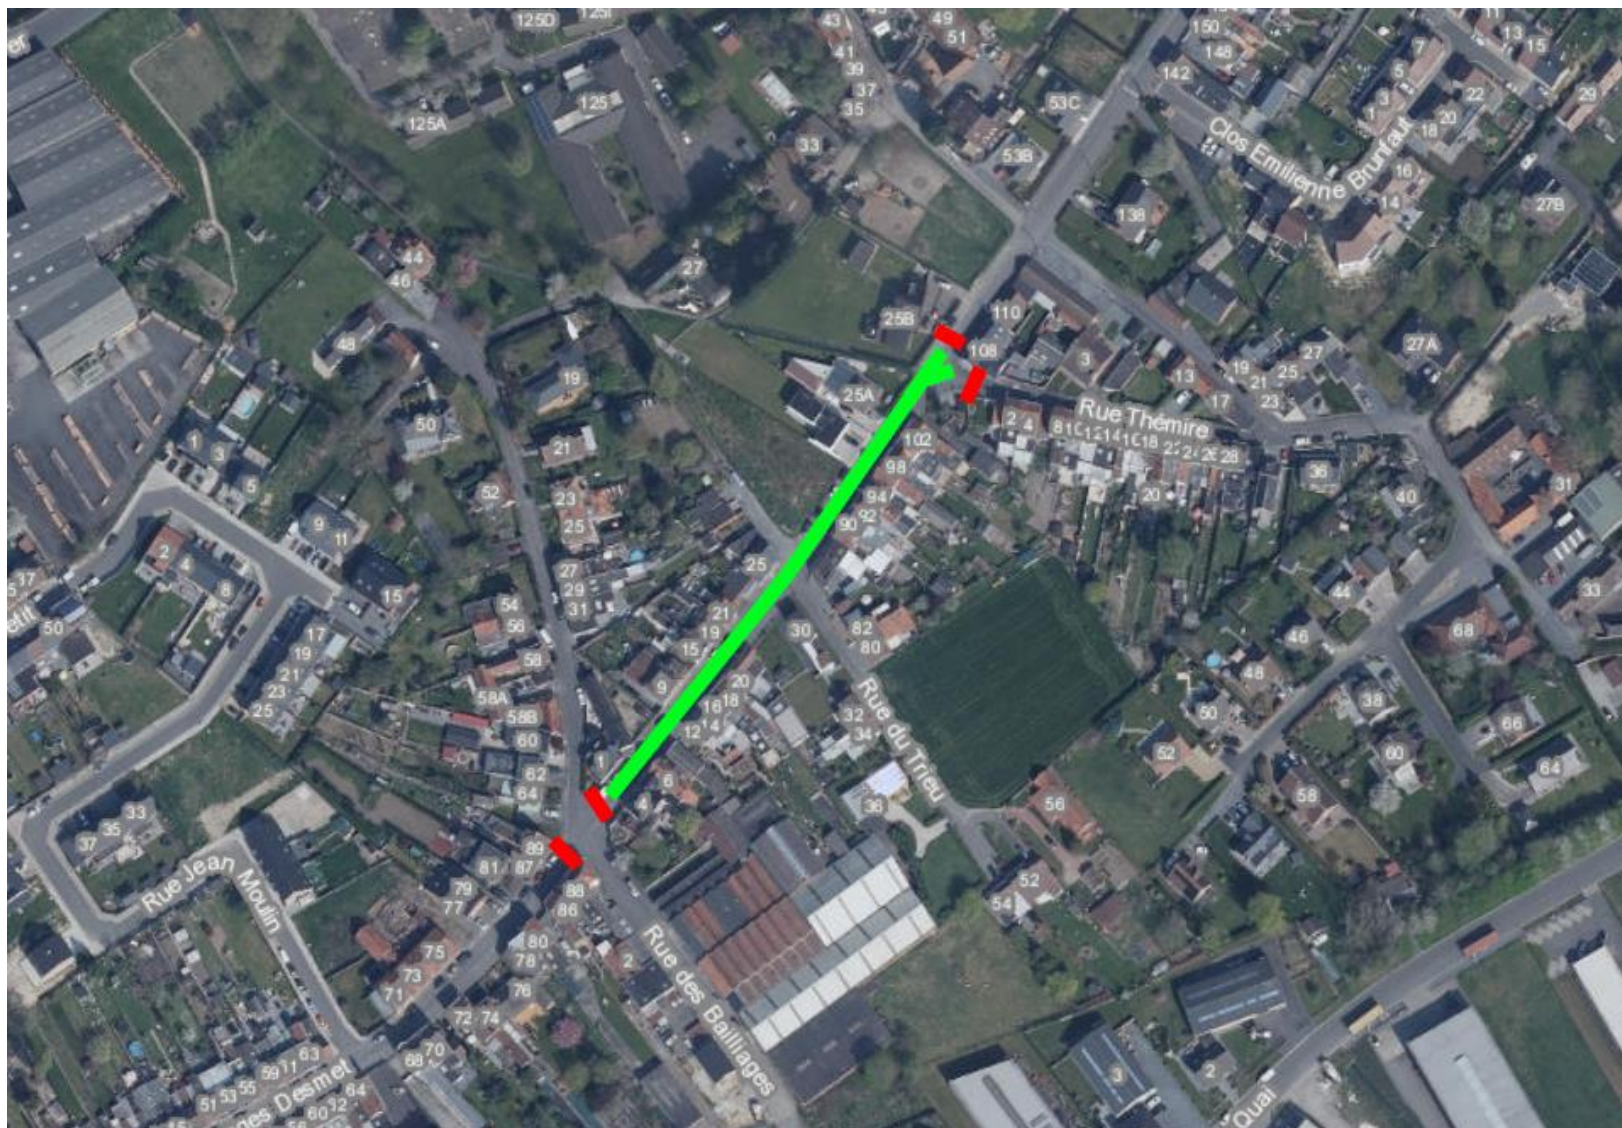

Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Phase 3 et 5 :

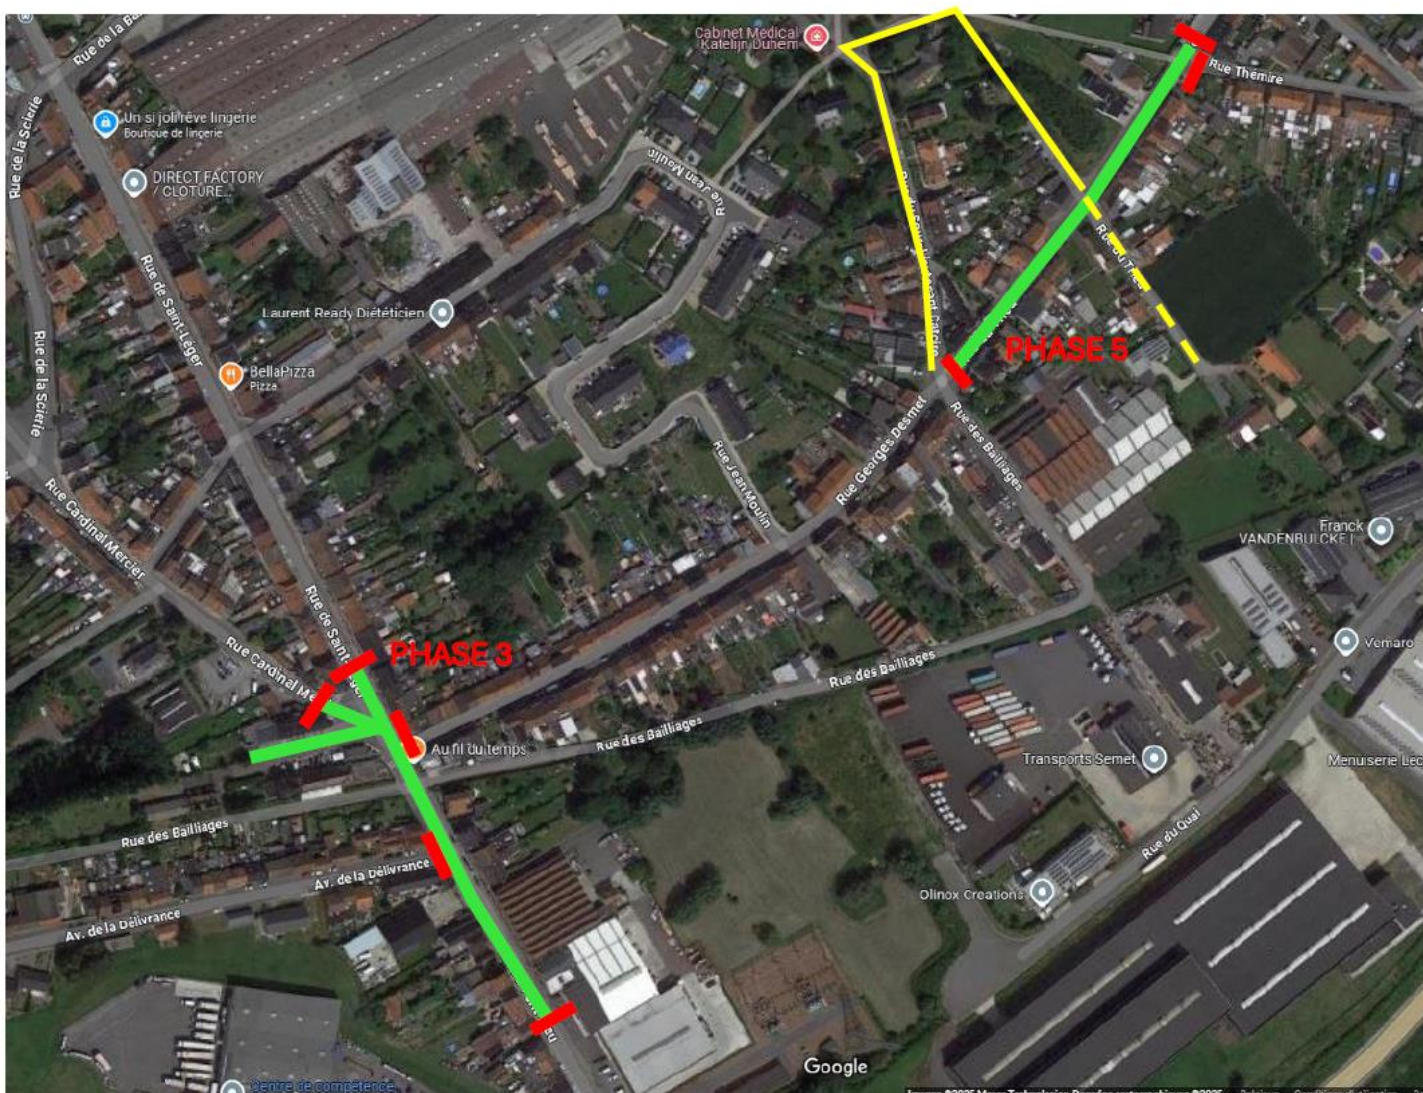

Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Phase 6 :



Rétroactes

08 février 2023 : réunion riverains – démarrage des travaux

27 février 2023 : Démarrage des sondages – avenue du Bois Jacquet (lot 4)

20 mars 2023 : Démarrage des travaux de la SP (lot3)

10 avril 2023 : démarrage des travaux d'égouttage – avenue du Bois Jacquet (lot 4)

14 juin 2023 : Démarrage des sondages (lots 1 et 2)

→ Juillet à octobre

15 mai 2023 : Statage des travaux de la SP (lot3)

7 février 2024 : Obtention du permis de rabattement par le SPW


26 février 2024 : Ordre de commencer les travaux (lots 1 et 2)

Rétroactes

Rue du Pont Bleu (LOT 1 – phase 2a) :

- 27 février au 19 avril 2024 : Déplacements d'impétrants (carrefour) et début pose égouttage
- 22 avril au 14 juin 2024 : statage des travaux (SWDE)
- 17 juin au 15 novembre 2024 : pose de l'égouttage séparatif
- 18 novembre 2024 au 4 avril 2025 : pose des impétrants (en cours)
- 7 avril jusqu'en été : réfection de la voirie


Difficultés rencontrées – déplacements d'impétrants pour permettre la pose des deux réseaux d'égouttage

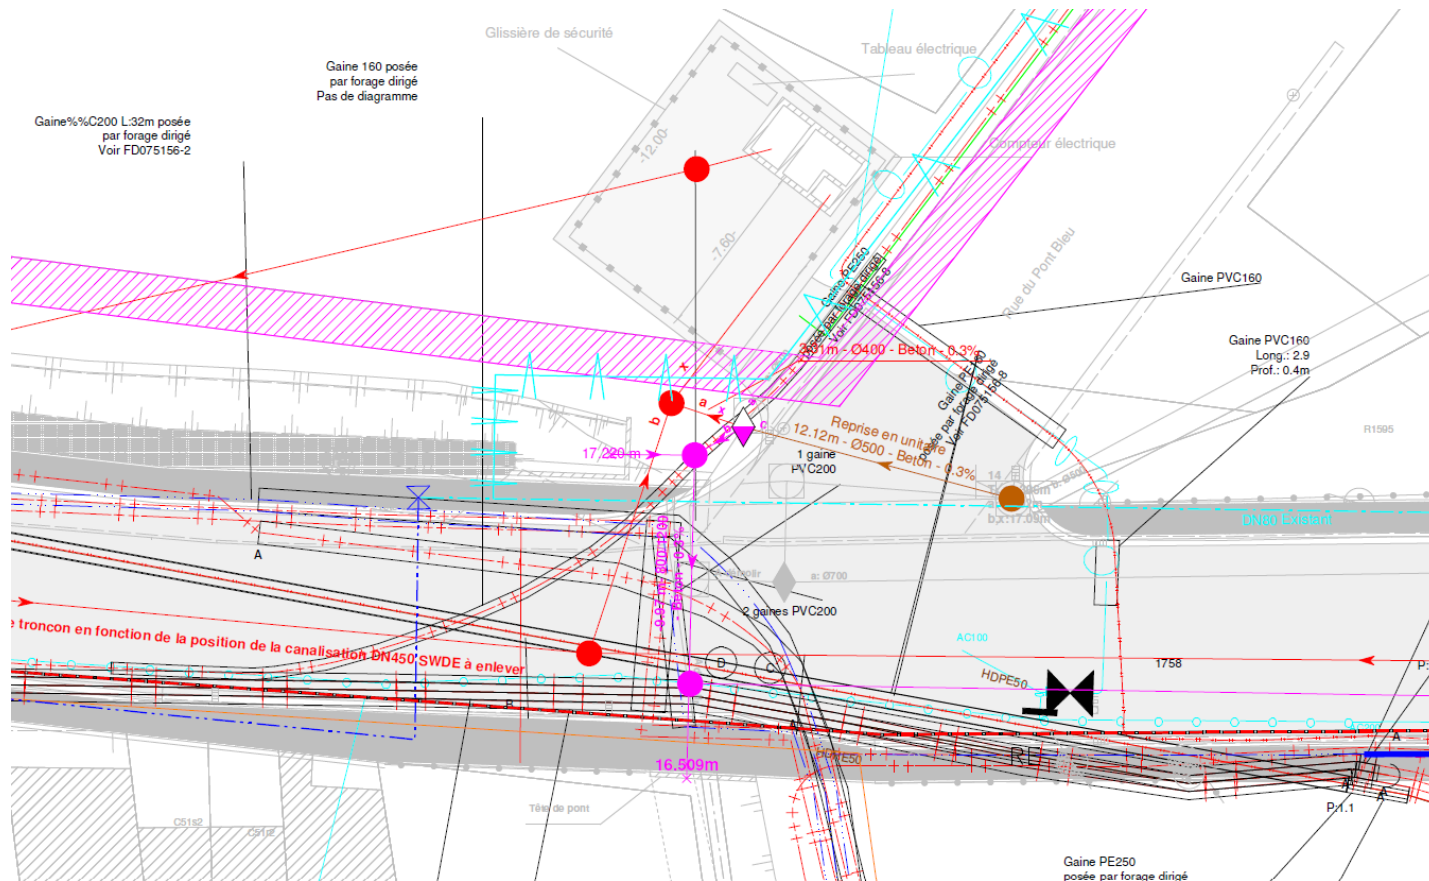

Difficultés rencontrées – déplacements d'impétrants pour permettre la pose des deux réseaux d'égouttage




Difficultés rencontrées – déplacements d'impétrants pour permettre la pose des deux réseaux d'égouttage

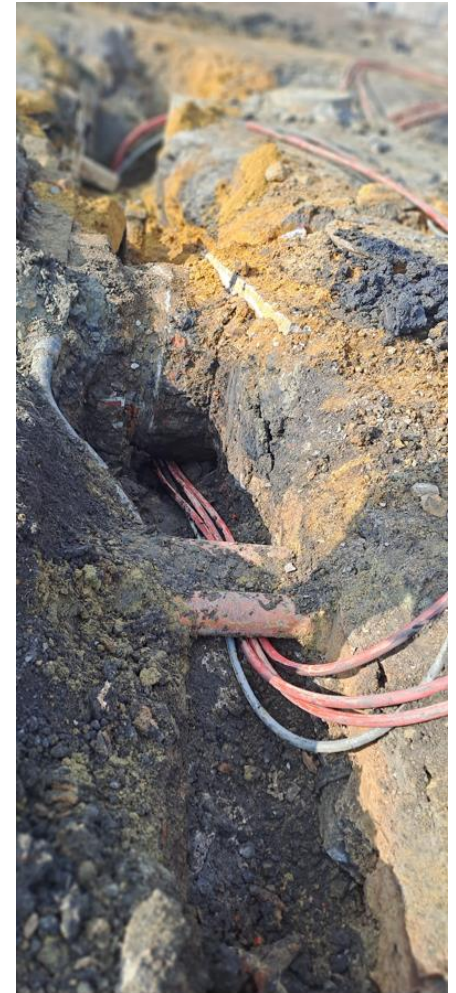

Difficultés rencontrées – déplacements d'impétrants pour permettre la pose des deux réseaux d'égouttage



Difficultés rencontrées – remplacement complet des réseaux d'impétrants dans le cadre du chantier de voirie


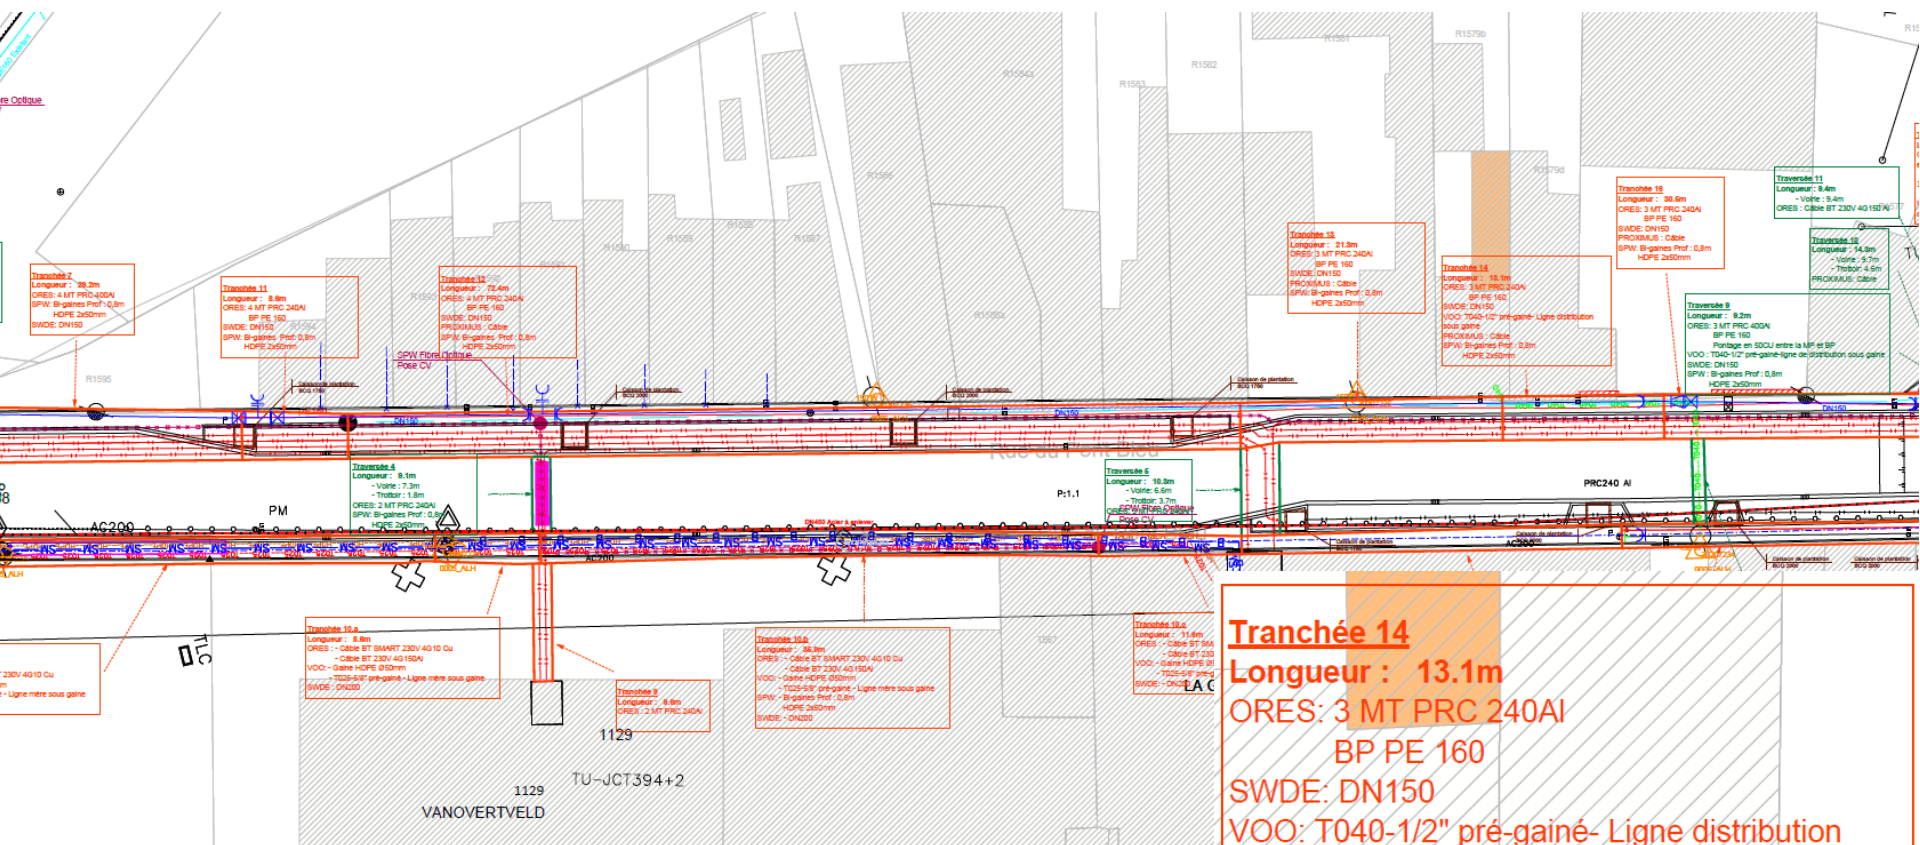


Difficultés rencontrées – rabattement de la nappe phréatique



Volumes et débits importants nécessitant un permis d'environnement (classe 2) + un monitoring

Difficultés rencontrées – portance du sol

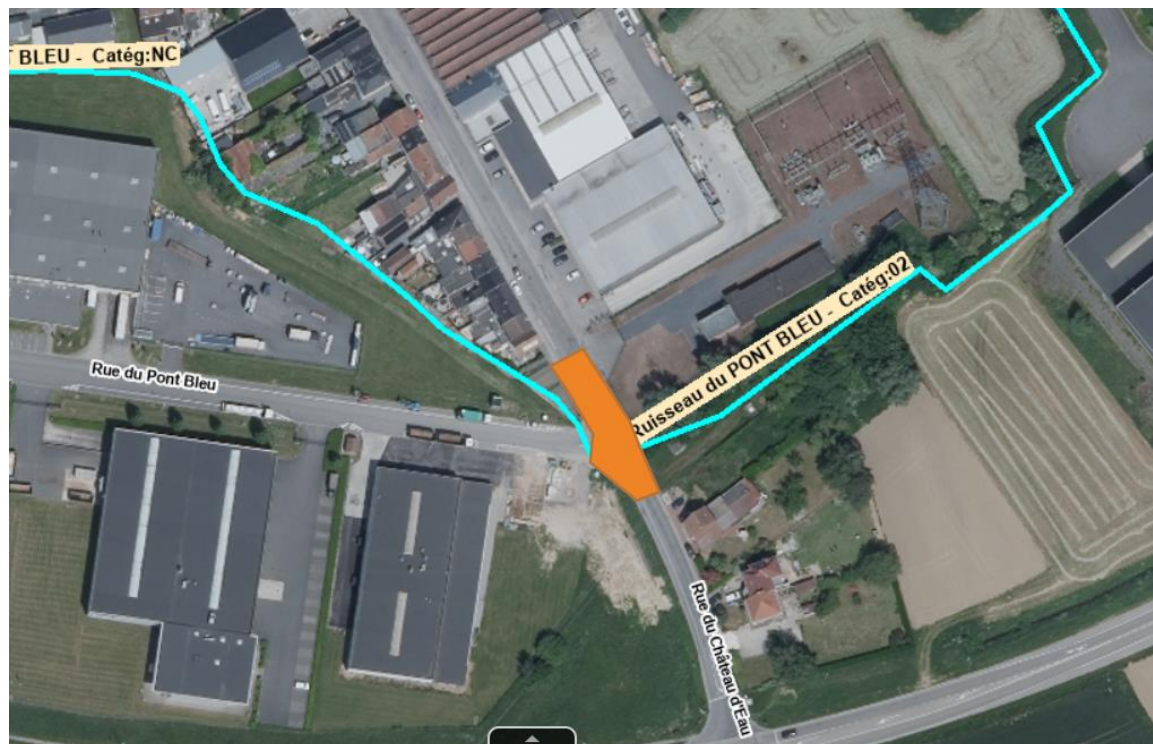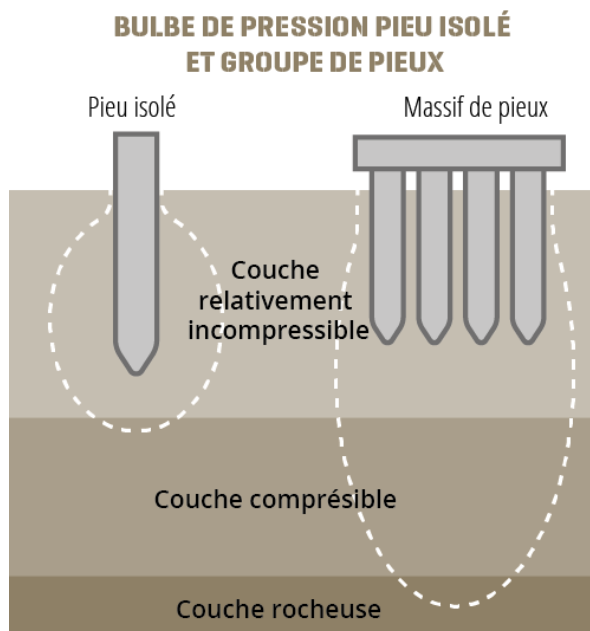

Difficultés rencontrées – portance du sol



Difficultés rencontrées – blindage à adapter



Réactions de l'entrepreneur (égouttage)

- 13 septembre 2024 : Mise en place d'une motopompe afin de dévier les égouts existants en limite de phasage.





Réactions de l'entrepreneur (égouttage)

- 13 septembre 2024 : Mise en place d'un **blindage coulissant adapté** au travail :



Réactions de l'entrepreneur (égouttage)

Après

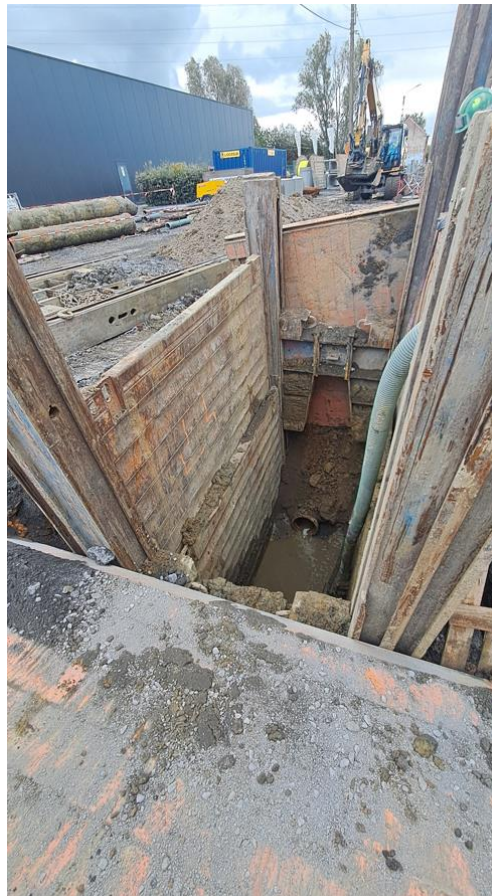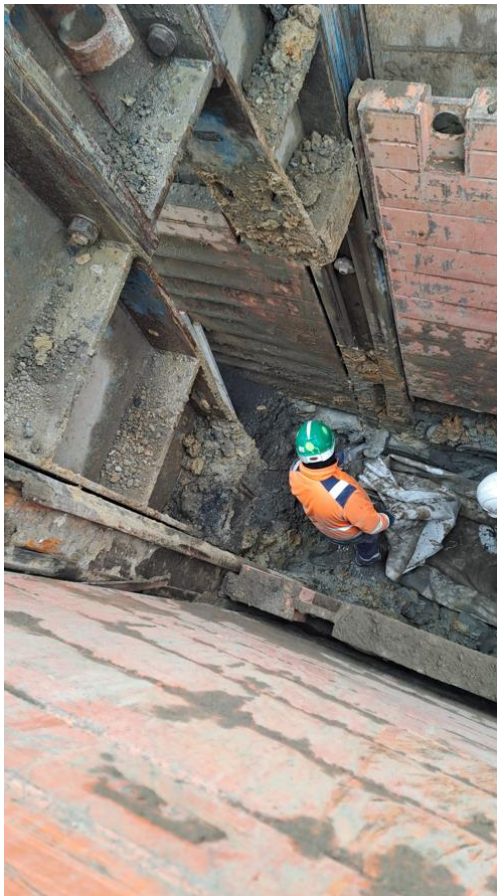

Réactions de l'entrepreneur (égouttage)

Mise en place d'un **blindage coulissant adapté** au travail :



Réactions de l'entrepreneur (impétrants)

- Mise en place d'un **blindage adapté** au travail :



Avant



Après



Planning prévisionnel (Hors intempéries)

Rue du Pont Bleu (LOT 1 – phase 3) :

- Été 2025 et automne 2025 : pose de l'égouttage séparatif
- Ensuite :
 - pose des impétrants : automne 2025 à printemps 2026
 - réfection de la voirie : printemps 2026 et été 2026

Rétroactes

26 février 2024 : Ordre de commencer les travaux (lots 1 et 2)

Rue du Trieu (LOT 2 – phase 2b) : ✓

- 27 février au 14 juin 2024 : pose de l'égouttage séparatif
- 17 juin au 25 octobre 2024 : pose des impétrants
- 28 octobre 2024 au 31 janvier 2025 : réfection de la voirie

Réunion d'information Riverains - « Quartier du Pont Bleu à Dottignies »

Rue du Trieu (LOT 2 – phase 2b) : ✓



Rue du Trieu (LOT 2 – phase 2b) : ✓



Rue du Trieu (LOT 2 – phase 2b) : ✓



Planning prévisionnel (hors intempéries)

Rue du Trieu (LOT 2 – phase 4) :

- 3 février au 28 mars 2025 : pose de l'égouttage séparatif (en cours)
- Printemps 2025 : pose des impétrants
- été 2025 : réfection de la voirie

Planning prévisionnel (hors intempéries)

Rue du Trieu (LOT 2 – phase 5) :

- Été jusque hiver 2025

Rue du Trieu (LOT 2 – phase 6) :

- Été 2026 (après la phase 3) à printemps 2027

Un chantier : DES QUESTIONS ?



Merci de votre attention
